

2013/09
申請

2020/10
認可

新規制基準に基づく
許認可手続き

2021/1~

新規制基準に基づく
安全対策工事

安全対策
工事の未完了

2021/1~

一連の核物質
防護事案

「安全対策工事の未完了」について

- 2021年1月12日、「7号機の安全対策工事が完了」とお知らせしたが、直後の1月27日に**未完了箇所があったことが判明**
- 同様の事案がないか**総点検を実施し、合計で107箇所の未完了箇所を確認**

総点検の様子



未完了箇所の内訳

工事の種類	箇所数
火災防護設備の設置工事 (重要な機器・設備を火災から守るための工事)	12箇所
浸水防護処理 (貫通部) (建屋内に水が浸入した際に、配管等の貫通部からの浸水を防ぐ工事)	15箇所
火災防護処理 (貫通部) (建屋内で火災が発生した際に、配管等の貫通部からの延焼・煙の流入を防ぐ工事)	80箇所


未完了箇所が多く確認された貫通部の総点検

「一連の核物質防護事案」について

- 核物質防護にかかる以下の2事案をうけて、2021年3月23日、原子力規制委員会より、**改善措置計画の提出命令**、**追加検査実施の通知**を受領
- 2021年4月14日、**核燃料物質の移動を禁じる措置命令**を受領

核物質防護設備の機能の一部喪失

IDカード不正使用

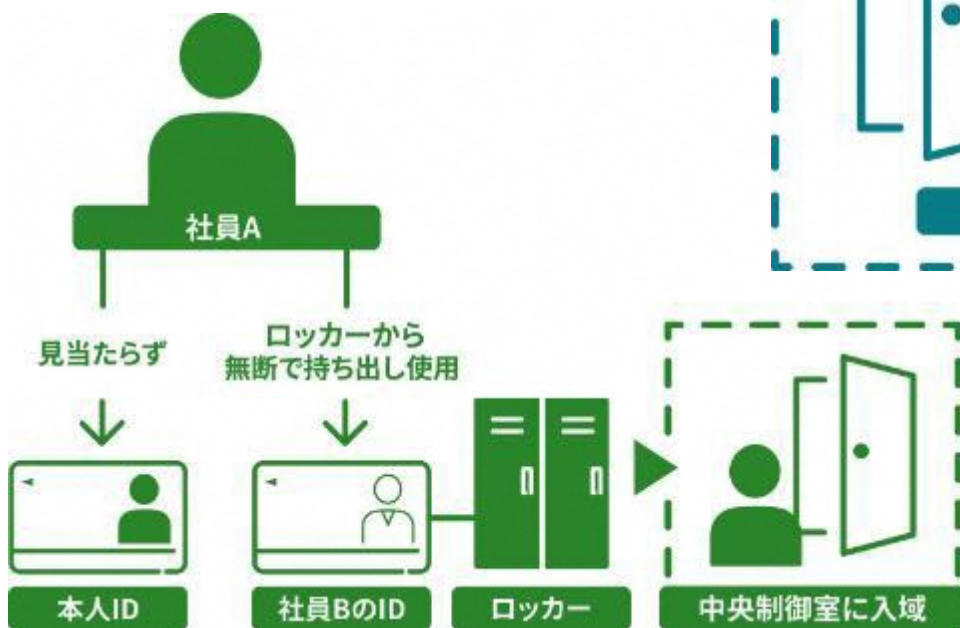

ここ2年の振り返り ②事案の発生～現在まで

2013/09
申請

2020/10
認可

新規制基準に基づく
許認可手続き

現在

新規制基準に基づく
安全対策工事

2021/1～

是正工事・
使用前事業者検査

燃料装荷前
使用前事業者検査一巡

安全対策
工事の未完了

2022/9

工事未完了の総点検

2021/1～

一連の核物質
防護事案

2021/9

改善措置計画提出

改善措置活動

継続・
定着化

2021/3

検査区分変更

追加検査対応

「原子力改革」の推進

- 一連の事案を通じて認識された「現場実態把握の弱さ」、「組織間の連携不足」といった組織の弱みを踏まえ、「**原子力改革**」を推進

本社機能の一部移転



柏崎市内に開設した事務所の様子

外部の知見の取り入れ



外部人財（消防OB）による現場指導
